

『見える安全活動』実施状況

工事名：サンルダム堤体建設工事作業所

休憩所



朝礼看板



ダンプトラック適正積載荷姿の「見える化」による過積載防止活動




ダンプトラックの過積載防止のため

以下の項目を実施しました。

- ①実際の積込物を町内で計量
計量結果から
- ②最大積載量のラインを明示

これらを休憩所、朝礼看板に貼り出し、周知をしています。

架空線横断部

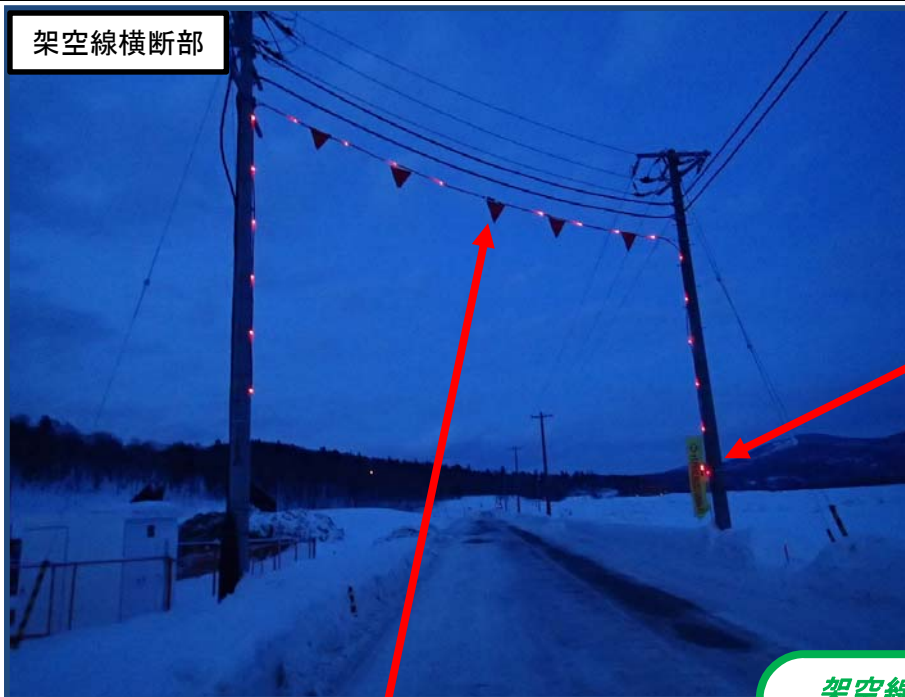

架空線接触を防止するため

昼間は三角旗・のぼり旗による明示、夜間はチューブタイプの点滅灯による注意喚起を行うことで、重機等の架空線接触を防止しています。



『見える安全活動』実施状況


工事名： サンルダム堤体建設工事

第三者災害防止に向けた二重の立入措置 (1/2)



コメント 人員固定の作業場（プラント）の二重立入措置として、通門管理制度を追加した。

第三者災害防止に向けた二重の立入措置 (2/2)

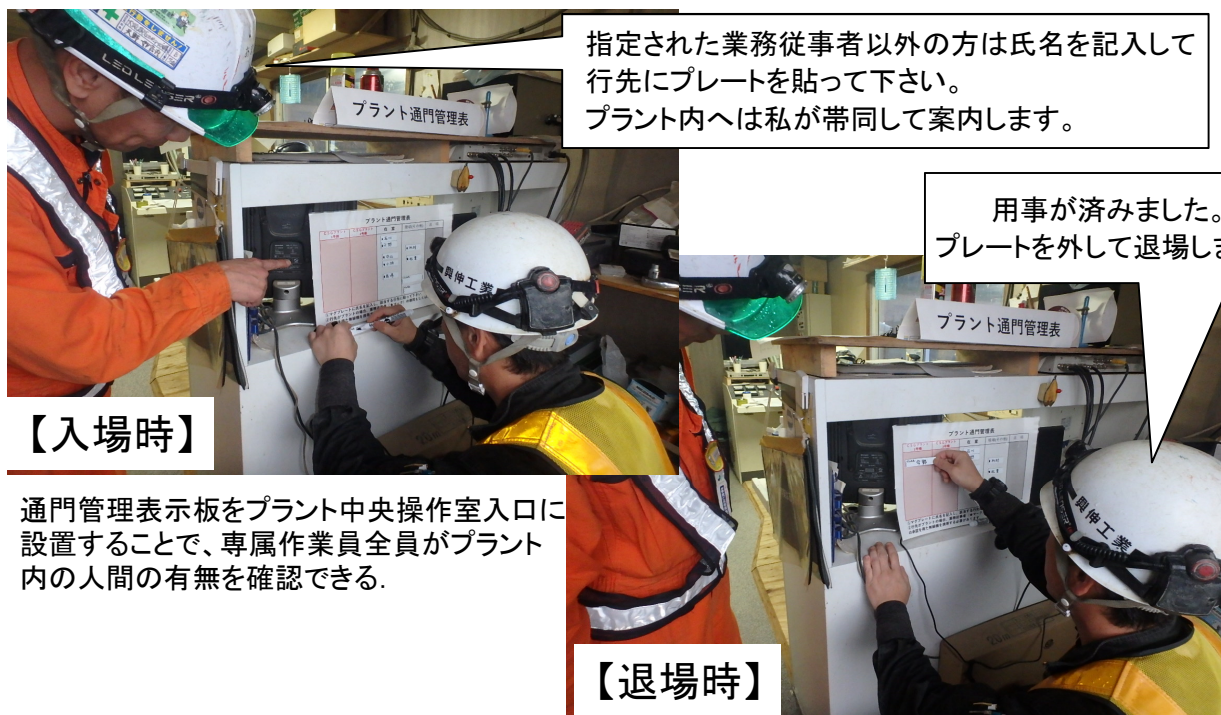

【入場時】

通門管理表示板をプラント中央操作室入口に設置することで、専属作業員全員がプラント内の人間の有無を確認できる。

【退場時】

コメント プラント立入者の所在を明確にし、それを関係者に周知することで第三者災害を防ぐ。
